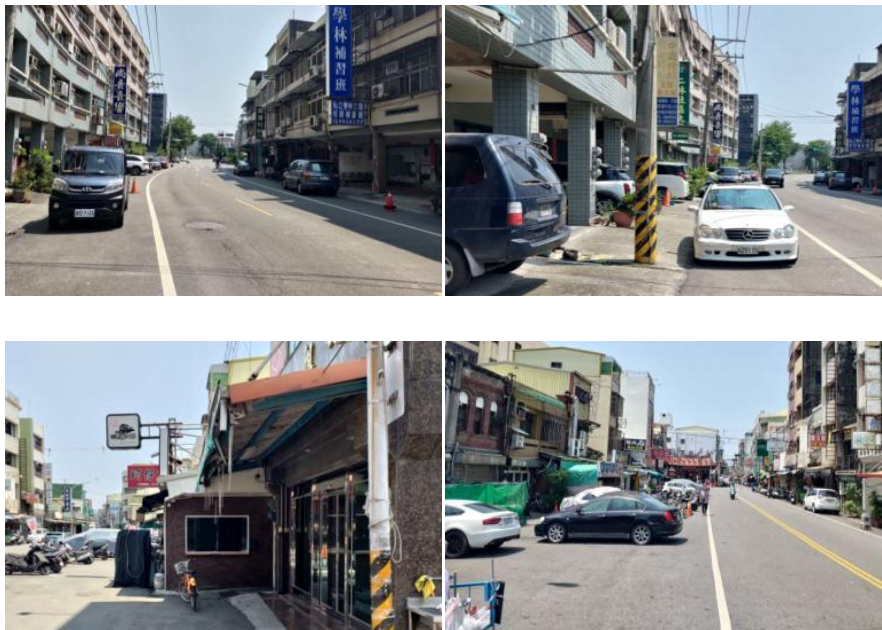


「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度(114 年 3 月份)

工 程 名 稱	彰化縣二林鎮南安路及仁和宮周邊人行環境建置計畫
改 善 項 目	1. 南安路建置人行道長度約 2300m(雙側) 2. 儒林路二段(仁和宮)建置人行道長度約 80m
施 工 地 點	南安路、儒林路二段(仁和宮)
目 前 進 度	1. 114 年 3 月 6 日完成「設計監造委託技術服務」廠商之招標作業。 2. 進行基本設計中。
預 定 完 工 日 期	114 年 12 月底
施工前、中、後照片	1. 尚未開工。 2. 施工前照片： 
其 他 公 開 訊 息	預計於基本設計完成後召開地方說明會。
