「永續提升人行安全計畫」補助計畫執行進度（114 年 2 月份）

<table>
<tr><td>工程名稱</td><td>大村鄉幼兒園及長照中心周遭人行環境改善工程</td></tr>
<tr><td>改善項目</td><td>新建大村幼兒園及長照中心周邊，及未來將興建之共融公園進行人行道串連及行人安全優化措施，提升道路安全及人本環境之基礎建設</td></tr>
<tr><td>施工地點</td><td>彰化縣大村鄉鄉立幼兒園及長照中心周邊</td></tr>
<tr><td>目前進度</td><td>1、於 114 年 1 月 24 日委託技術服務廠商提交預算書圖初稿。
2、於 114 年 2 月 17 日提交修正計畫書（第一版）送縣府備查。</td></tr>
<tr><td>預定完工日期</td><td>114 年 10 月 31 日</td></tr>
<tr><td>施工前、中、後照片</td><td>1、尚未開工
2、施工前照片

 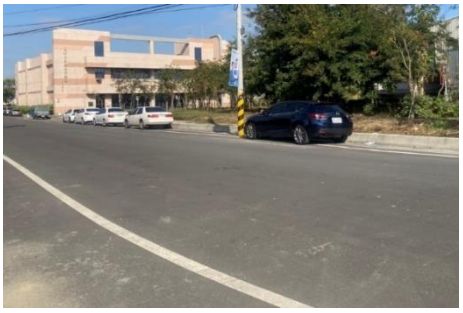 </td></tr>
<tr><td>其他公開訊息</td><td></td></tr>
</table>
